



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 923 / GABI / 2021

Ponte Nova, 21 de dezembro de 2021.

À Sua Excelência o Senhor  
Antônio Carlos Pracatá de Sousa  
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova  
Ponte Nova – MG

**Assunto: Respostas aos ofícios 1046/2021/SAPL/DGRI; 1057/2021/SAPL/DGRI**

Senhor Presidente:

Em atendimento aos Ofícios nº 1046/2021/SAPL/DGRI, e Ofício nº 1057/2021 da Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhamos em anexo, planilha e cronograma das obras em execução no município, incluindo as das escolas municipais.

  
**Wagner Mol Guimarães**  
**Prefeito Municipal**

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 1629/2021  
Data: 21/12/2021 - Horário: 19:02  
Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA RODOVIÁRIA VELHA	DATA: dezembro de 2021
LOCAL: R. ANTONIO FREDERICO OZANAN, S/N - CENTRO, PONTE NOVA - MG, CEP:35430-029	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 12/2018, SETOP 10/2018 - COM DESONERAÇÃO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES	

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% R\$ 928.296,77	19,46% R\$ 180.670,13	30,63% R\$ 284.337,85	35,25% R\$ 327.197,19	14,66% R\$ 136.091,60		

**OBSERVAÇÕES:** Os valores informados contemplam o valor original do contrato, reequilíbrio econômico e aditivo  
Fiscal responsável: Marcela Giardini Freitas - Eng. Civil CREA 213190/D  
Data de início da obra: 01/04/2020 - Previsão de término: Dezembro de 2021  
A obra encontra-se na etapa de finalização, faltando somente a instalação das portas de vidro no mini-mercado e ajustes finais.

**LEGENDA:**  Serviços concluídos  
 Serviços em execução



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SIPLADE

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA</b>		<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS - VAU AÇU</b>		<b>DATA: dezembro de 2021</b>				
<b>LOCAL: RUA CONCEIÇÃO BARBOSA COLOMBARI, S/N, DISTRITO VAU AÇU</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>						
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 08/2018, ORSE 07/2018, SUDÉCAP 07/2018, SETOP 07/2018 - COM DESONERAC</b>		()	DIRETA	(X)	INDIRETA			
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES</b>				LDI	24,76%			
ITEM	ETAPAS	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
[REDACTED]								
<b>TOTAL</b>	<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,85%</b>	<b>18,00%</b>	<b>17,68%</b>	<b>19,26%</b>	<b>13,13%</b>	<b>12,08%</b>
	<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 144.504,60</b>	<b>R\$ 28.485,71</b>	<b>R\$ 26.010,48</b>	<b>R\$ 25.550,01</b>	<b>R\$ 27.843,97</b>	<b>R\$ 18.975,83</b>	<b>R\$ 17.418,39</b>

**OBSERVAÇÕES:** Os valores informados contemplam o valor original do contrato e reajuste.

Fiscal responsável: Marcela Giardini Freitas - Eng. Civil CREA 213190/D

Data de início da obra: 18/01/2021

A obra encontra-se em finalização. Faltam apenas a instalação de uma porta, metais, logica e telefonia. Previsão de término janeiro/2022.

**LEGENDA:**  
[ ] Serviços concluídos  
[ ] Serviços em execução



Prefeitura de  
Ponte Nova  
Gestão 2017-2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG			VALOR DO CONVENIO:							DATA: dezembro de 2021		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1			LOCAL: RUA ANTONIO LANNA SETTE, S/N - BAIRRO BOM PASTOR/PALMEIRENSE							PRAZO DA OBRA: 09 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
2	MUROS E OUTROS FECHAMENTOS	Físico %	4,78%	80,00%	80,00%							
		Financeiro	R\$ 31.767,63	R\$ 15.883,81	R\$ 15.883,81							
4	COBERTURA	Físico %	7,84%					80,00%	80,00%			
		Financeiro	R\$ 52.461,07				R\$ 26.230,53	R\$ 26.230,53				
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	8,44%			80,00%	80,00%		10,00%			
		Financeiro	R\$ 57.799,70			R\$ 17.339,91	R\$ 17.339,91	R\$ 17.339,91	R\$ 5.779,97			
6	REVESTIMENTOS - PISOS	Físico %	7,13%						28,00%	28,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 47.687,90						R\$ 11.921,97	R\$ 11.921,97	R\$ 11.921,97	R\$ 11.921,97
7	REVESTIMENTOS - PAREDES	Físico %	17,09%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 114.304,02					R\$ 22.860,80	R\$ 22.860,80	R\$ 22.860,80	R\$ 22.860,80	R\$ 22.860,80
8	REVESTIMENTOS - TETOS	Físico %	2,97%					30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
		Financeiro	R\$ 19.841,54					R\$ 5.952,46	R\$ 3.968,31	R\$ 3.968,31	R\$ 5.952,46	
9	ESQUADRIAS	Físico %	7,48%						30,00%	20,00%	20,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 49.845,09						R\$ 14.953,53	R\$ 9.969,02	R\$ 9.969,02	R\$ 14.953,53
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	8,86%						80,00%	80,00%		
		Financeiro	R\$ 39.154,67						R\$ 19.577,34	R\$ 19.577,34		
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	8,39%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$ 56.138,08			R\$ 11.227,62	R\$ 11.227,62	R\$ 11.227,62	R\$ 11.227,62	R\$ 11.227,62		
12	REDE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,58%								50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 3.669,66								R\$ 1.834,83	R\$ 1.834,83
14	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	Físico %	0,38%									100,00%
		Financeiro	R\$ 2.371,33									R\$ 2.371,33
<b>TOTAL</b>		Físico %	100,00%	12,89%	9,99%	11,89%	7,81%	12,80%	17,42%	11,89%	7,86%	8,04%
		Financeiro	R\$ 669.022,56	R\$ 84.244,77	R\$ 66.841,44	R\$ 79.526,18	R\$ 52.273,20	R\$ 83.611,32	R\$ 116.520,07	R\$ 79.525,06	R\$ 52.539,07	R\$ 53.942,46

OBSERVAÇÕES: Os valores informados contemplam o valor original do contrato, reequilíbrio econômico e reajuste.

Fiscal responsável: Marcela Giardini Freitas - Eng. Civil CREA 213190/D

Data de início da obra: 01/09/2021 - Previsão de término: Junho de 2022

A obra encontra-se na etapa de execução da superestrutura. Já foi finalizado toda a parte de fundação (sapatas + vigas baldrame) e o prolongamento da rua.

LEGENDA:

	Serviços concluídos
	Serviços em execução
	Serviços a executar



Prefeitura de  
Ponte Nova  
Gestão 2017-2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG			VALOR DO CONVENIO:							DATA: dezembro de 2021		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1			LOCAL: RUA MARIA CONSENZA, S/N - BAIRRO VALE DO IPÊ							PRAZO DA OBRA: 09 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	MONILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	2,38%	100,00%								
		Financeiro	R\$ 24.585,33	R\$ 24.585,33								
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	11,85%					50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 123.713,30					R\$ 61.856,65	R\$ 61.856,65			
5	COBERTURA	Físico %	4,02%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
		Financeiro	R\$ 41.936,38			R\$ 12.580,91	R\$ 12.580,91	R\$ 12.580,91	R\$ 4.193,64			
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	6,58%						28,00%	28,00%	28,00%	28,00%
		Financeiro	R\$ 68.742,95						R\$ 17.185,74	R\$ 17.185,74	R\$ 17.185,74	R\$ 17.185,74
7	REVESTIMENTOS - PISOS	Físico %	7,80%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 81.510,84					R\$ 16.302,17	R\$ 16.302,17	R\$ 16.302,17	R\$ 16.302,17	R\$ 16.302,17
8	REVESTIMENTOS - PAREDES	Físico %	7,94%					30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 83.136,72					R\$ 24.941,02	R\$ 16.627,34	R\$ 16.627,34	R\$ 24.941,02	
9	REVESTIMENTOS - TETOS	Físico %	1,40%						30,00%	20,00%	20,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 14.643,48						R\$ 4.393,04	R\$ 2.928,70	R\$ 2.928,70	R\$ 4.393,04
10	ESQUADRIAS	Físico %	6,33%						50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 55.710,27						R\$ 27.855,13	R\$ 27.855,13		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	3,13%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		Financeiro	R\$ 32.655,40			R\$ 6.531,08	R\$ 6.531,08	R\$ 6.531,08	R\$ 6.531,08			
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	5,07%								50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 52.916,08								R\$ 26.458,04	R\$ 26.458,04
13	REDE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,38%									100,00%
		Financeiro	R\$ 3.687,91									R\$ 3.687,91
14	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	Físico %	2,10%									100,00%
		Financeiro	R\$ 21.938,61									R\$ 21.938,61
<b>TOTAL</b>		Físico %	97,90%	18,76%	10,75%	12,58%	8,99%	11,70%	14,84%	8,37%	8,41%	8,41%
		Financeiro	R\$ 1.044.425,75	R\$ 144.565,24	R\$ 112.225,71	R\$ 131.357,70	R\$ 93.929,13	R\$ 122.211,83	R\$ 164.944,80	R\$ 87.430,14	R\$ 87.815,64	R\$ 89.945,50

OBSERVAÇÕES: Os valores informados contemplam o valor original do contrato, reequilíbrio econômico e aditivo

Fiscal responsável: Marcela Giardini Freitas - Eng. Civil CREA 213190/D

Data de início da obra: 06/01/2021 (para execução dos muros)

A obra encontra-se na etapa de finalização dos muros de contenção. Já foi finalizada a terraplanagem para o plotô onde será construída a UBS. A construção da UBS (edificação) será iniciada em janeiro de 2022 com previsão de término em setembro de 2022.

LEGENDA:

	Serviços concluídos
	Serviços em execução
	Serviços a executar







20	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Financeiro	R\$ 16.571,83		R\$ 828,59	R\$ 2.485,77				R\$ 9.943,10	R\$ 3.314,37
21	...										
22	...										
24	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,24%							30%	70%
		Financeiro	R\$ 5.133,21							R\$ 1.539,96	R\$ 3.593,25
		Físico %	100,00%	9,87%	17,20%	10,49%	15,67%	17,45%	17,08%	10,01%	2,08%
	TOTAL	Financeiro	R\$ 2.158.028,44	R\$ 212.897,46	R\$ 371.254,06	R\$ 230.444,05	R\$ 338.243,57	R\$ 374.566,59	R\$ 348.531,79	R\$ 216.087,62	R\$ 43.803,30

OBSERVAÇÕES: Os valores informados contemplam o valor original do contrato, reequilíbrio econômico e aditivo.

Fiscal responsável: Marcela Giardini Freitas - Eng. Civil CREA 213190/D

Data de início da obra: 27/11/2019- Previsão de término: Março de 2022

A obra encontra-se em fase de acatamento interno e externo, execução de instalações elétricas e hidrossanitárias, e execução dos muros.

LEGENDA:

	Serviços concluídos
	Serviços em execução
	Serviços a executar

**PREFEITURA DE  
PONTE NOVA****PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG  
ESTADO DE MINAS GERAIS****CRONOGRAMA DE ANDAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: MUNICIPAL DE PONTE NOVA		VALOR DO CONTRATO: R\$ 279.500,02		DATA: dezembro de 2021											
OBRA: Etapa II - Ponte Copacabana vão 20m		LOCAL: Acesso ao Bairro Copacabana		PRAZO DA OBRA: 04 meses											
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6						
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,01%	104,01%											
		Financeiro	R\$ 8.424,31	R\$ 8.761,83											
2	SUPER-ESTRUTURA	Físico %	53,02%	25,00%	25,00%	50,00%									
		Financeiro	R\$ 148.202,54	R\$ 37.050,64	R\$ 37.050,64	R\$ 74.101,27									
3	DIVERSOS	Físico %	2,48%			100,00%									
		Financeiro	R\$ 7.491,09			R\$ 7.491,09									
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	6,51%	50,00%	50,00%										
		Financeiro	R\$ 18.206,64	R\$ 9.102,32	R\$ 9.102,32										
5	CORRIMÃO	Físico %	34,77%			50,00%	50,00%								
		Financeiro	R\$ 97.177,44			R\$ 48.588,72	R\$ 48.588,72								
<b>TOTAL</b>		Físico %	100,00%	19,65%	14,61%	44,58%	17,38%								
		Financeiro	R\$ 279.500,02	R\$ 54.914,79	R\$ 46.152,96	R\$ 130.181,08	R\$ 48.588,72								
<b>OBSERVAÇÕES:</b> Os valores informados contemplam o valor original do contrato. Fiscal responsável: Marcela Giardini Freitas - Eng. Civil CREA 213190/D Data de início da obra: 13/09/2021 - Previsão de término: Janeiro de 2022 A obra encontra-se na etapa concretagem do tabuleiro.															
<b>LEGENDA:</b> <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></td> <td>Serviços concluídos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></td> <td>Serviços em execução</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></td> <td>Serviços a executar</td> </tr> </table>											Serviços concluídos		Serviços em execução		Serviços a executar
	Serviços concluídos														
	Serviços em execução														
	Serviços a executar														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG		VALOR DO CONVÊNIO:										DATA: dezembro de 2021			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		BARRIO DALVO DE OLIVEIRA BEMFETO/VILA ALVARENGA										PRAZO DA OBRA: 10 meses			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
<b>TOTAL</b>		Físico %	100,00%	4,94%	1,59%	3,19%	2,47%	11,13%	12,20%	7,87%	7,34%	12,47%	11,46%	9,41%	18,34%
		Financeiro	R\$ 758.944,06	R\$ 37.612,40	R\$ 12.031,35	R\$ 23.744,80	R\$ 20.287,92	R\$ 84.444,54	R\$ 92.677,18	R\$ 59.747,84	R\$ 53.815,97	R\$ 96.169,89	R\$ 84.990,44	R\$ 72.943,20	R\$ 116.554,80

OBSERVAÇÕES: Os valores informados contemplam o valor original do contrato, reequilíbrio econômico e aditivo.

Fiscal responsável: Marcela Giardini Freitas - Eng. Civil CREA 213180/D

Data de início da obra: 04/02/2019 - Previsão de término: Março de 2022

A obra encontra-se em fase de acatamento interno e externo, execução de instalações elétricas, finalização das instalações hidráulicas e execução do muro frontal para conformar o acesso.


LEGENDA:

- Serviços concluídos
- Serviços em execução
- Serviços a executar

**COMPARATIVO CRONOGRAMA FINANCEIRO**

Nº Medição	Referência	FINANCEIRO INICIAL (EDITAL)		REALIZADO	
		Mês	Acm	Mês	Acm
1ª	01/02/21 a 28/02/21	R\$ 99.250,96	R\$ 99.250,96	R\$ 179.769,60	R\$ 179.769,60
2ª	01/03/21 a 31/03/21	R\$ 659.648,33	R\$ 758.899,29	R\$ 371.885,34	R\$ 551.654,94
3ª	01/04/21 a 30/04/21	R\$ 1.358.163,17	R\$ 2.117.062,46	R\$ 612.269,88	R\$ 1.163.924,82
4ª	01/05/21 a 31/05/21	R\$ 1.358.163,17	R\$ 3.475.225,63	R\$ 569.634,68	R\$ 1.733.559,50
5ª	01/06/21 a 30/06/21	R\$ 1.358.163,17	R\$ 4.833.388,80	R\$ 236.831,16	R\$ 1.970.390,66
6ª	01/07/21 a 31/07/21	R\$ 1.358.163,17	R\$ 6.191.551,98	R\$ 598.158,20	R\$ 2.568.548,86
7ª	01/08/21 a 31/08/21	R\$ 1.358.163,17	R\$ 7.549.715,15	R\$ 720.454,20	R\$ 3.289.003,06
8ª	01/09/21 a 30/09/21	R\$ 1.657.988,99	R\$ 9.207.704,14	R\$ 463.844,22	R\$ 3.752.847,28
9ª	01/10/21 a 31/10/21	R\$ 1.852.089,46	R\$ 11.059.793,60	R\$ 237.763,84	R\$ 3.990.611,12
10ª	01/11/21 a 30/11/21	R\$ 1.852.089,46	R\$ 12.911.883,06		
11ª	01/12/21 a 31/12/21	R\$ 2.141.145,22	R\$ 15.053.028,28		
12ª	01/01/22 a 31/01/22	R\$ 1.197.823,86	R\$ 16.250.852,13		
13ª	01/02/22 a 28/02/22	R\$ 908.768,10	R\$ 17.159.620,23		
14ª	01/03/22 a 31/03/22	R\$ 672.456,51	R\$ 17.832.076,74		
15ª	01/04/22 a 30/04/22	R\$ 603.411,71	R\$ 18.435.488,45		
16ª	01/05/22 a 31/05/22	R\$ 603.411,71	R\$ 19.038.900,17		
17ª	01/06/22 a 30/06/22	R\$ 603.411,71	R\$ 19.642.311,88		
18ª	01/07/22 a 31/07/22	R\$ 603.411,71	R\$ 20.245.723,59		
19ª	01/08/22 a 31/08/22	R\$ 659.648,33	R\$ 20.905.371,92		
20ª	01/09/22 a 30/09/22	R\$ 659.648,33	R\$ 21.565.020,25		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 21.565.020,25</b>		<b>R\$ 3.990.611,12</b>	

**COMPARATIVO CRONOGRAMA FINANCEIRO**

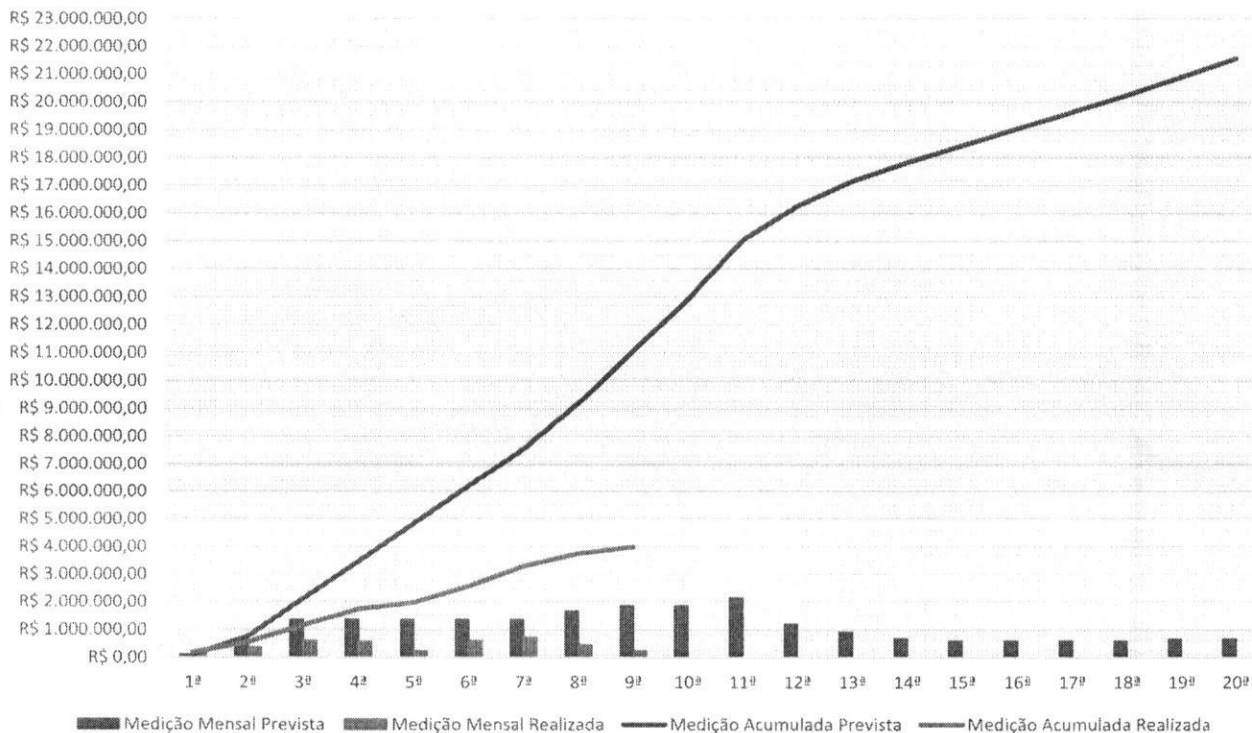

# VISÃO GERAL DO PROJETO


100% concluído - SEX 21/10/22

% COMPLETADO  
**24%**

MARCOS A VENCER  
Mínimo chegando em tempo

Nome	Término
CONCLUSÃO ESTRUTURA E MONTAGENS	Qua 20/02/22

% CONCLUÍDA  
Status de todas as tarefas de nível superior. Para ver o status de subtarefas, clique no gráfico e atualize o nível de estrutura de topicos na Lista de Campos.

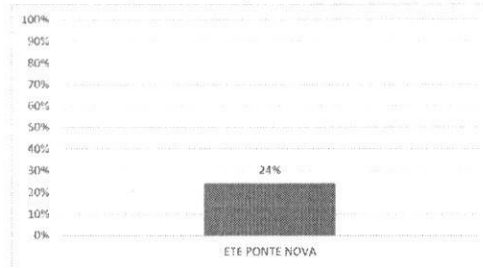

TAREFAS ATRASADAS  
Tarefas que estão vencidas.

Nome	Início	Término	Duração	% Concluída	Id
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Seg 01/02/21	Seg 26/09/22	419 dias	41%	6
MATERIAIS TUBOS	Seg 15/02/21	Seg 06/12/21	200 dias	53%	13
SINALIZAÇÃO	Seg 05/04/21	Seg 17/01/22	200 dias	53%	14
TOPOGRAFIA	Seg 01/02/21	Sex 28/01/22	230 dias	63%	16
MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO	Ter 23/02/21	Ter 25/01/22	200 dias	53%	17
ESCORAMENTO DE VALA	Ter 23/02/21	Ter 25/01/22	200 dias	53%	18
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Qua 31/03/21	Qui 13/01/22	200 dias	14%	19
ASSENTAMENTO DE TUBOS	Ter 23/02/21	Ter 25/01/22	200 dias	53%	20
MOVIMENTO DE TERRA REATERRO	Ter 23/02/21	Ter 25/01/22	200 dias	53%	21
SINALIZAÇÃO	Seg 19/07/21	Ter 20/07/21	2 dias	40%	25
SERVIÇOS PRELIMINARES	Qua 21/07/21	Ter 03/08/21	10 dias	40%	26
TOPOGRAFIA	Qua 23/06/21	Qui 19/05/22	200 dias	24%	27
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Sex 29/10/21	Sex 12/08/22	200 dias	0%	30
PROJETO ESTRUTURAL	Qua 10/02/21	Seg 20/09/21	140 dias	61%	138
FUNDAÇÃO	Qua 20/10/21	Qua 17/11/21	20 dias	0%	145
FUNDAÇÃO	Qui 02/09/21	Ter 19/10/21	20 dias	0%	152
ESTRUTURA	Qua 20/10/21	Ter 26/04/22	130 dias	0%	153
MATERIAIS	Qua 20/10/21	Qua 06/04/22	118 dias	0%	154
ACERTO DE TERRENO E LOCAÇÃO	Ter 21/09/21	Seg 04/10/21	10 dias	0%	158
FUNDAÇÃO	Ter 05/10/21	Ter 26/10/21	15 dias	0%	159
ESTRUTURA	Qui 27/10/21	Qua 08/12/21	30 dias	0%	160
MATERIAIS	Ter 21/09/21	Ter 19/10/21	20 dias	0%	161
SERVIÇOS	Ter 14/09/21	Qui 16/12/21	40 dias	0%	212
MATERIAIS TUBOS	Ter 14/09/21	Qua 10/11/21	40 dias	0%	213
SERVIÇOS	Qua 20/10/21	Qui 13/01/22	60 dias	0%	218
MATERIAIS TUBOS	Qua 20/10/21	Qui 13/01/22	60 dias	0%	219

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
**OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL**
**DATA DE INÍCIO: 12/07/2021**
**LOCAL: R. MANOEL ALVES DA SILVA - JOÃO ALVES DE OLIVEIRA**
**PREVISÃO DE TÉRMINO ATUALIZADO: 15/04/2022**
**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: [REDACTED]/TULIO**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	0,13% R\$ 647,95	100,00% R\$ 647,95					
2	DRENAGEM PLUVIAL	Físico % Financeiro	99,87% R\$ 479.352,03	50,00% R\$ 239.676,02	50,00% R\$ 239.676,02				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>TOTAL</b>		Físico % Financeiro	100,00% R\$ 479.999,98	50,07% R\$ 240.323,97	49,93% R\$ 239.676,02				

Obra apresentou diversos imprevistos como a interferência de redes de água e esgoto, além de cabos de fibra óticas encontradas após escavação. Dessa forma, somado ao período chuvoso que se inicia, o prazo foi diretamente afetado.

A obra será paralisada durante o período chuvoso e retornará após a estiagem para garantir o menor transtorno possível aos moradores.

A previsão de término poderá sofrer novas alterações dependendo das imprevisibilidades encontradas durante a execução dos serviços.



**Ponte Nova**  
Prefeitura Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: MUNICIPAL DE PONTE NOVA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: <del>MUNICIPAL</del> /TÍTULO				DATA DE INÍCIO: 18/05/2021			
OBRA: Galpão metálico para cobertura da Usina de Asfalto							PREVISÃO DE TÉRMINO ATUALIZADA: 25/04/2021			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,05%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 8.869,18	R\$ 8.869,18						
2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0,73%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 3.142,93	R\$ 3.142,93						
3	FUNDAÇÃO	Físico %	13,89%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 60.009,51	R\$ 60.009,51		R\$ 0,00				
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Físico %	50,75%		100,00%					
		Financeiro	R\$ 219.239,87		R\$ 219.239,87					
5	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	2,46%			100,00%				
		Financeiro	R\$ 11.500,42			R\$ 11.500,42				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220/380V	Físico %	3,06%			100,00%				
		Financeiro	R\$ 13.218,65			R\$ 13.218,65				
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	26,86%			100,00%				
		Financeiro	R\$ 116.019,44			R\$ 116.019,44				
<b>TOTAL</b>		Físico %	100,00%	16,67%	50,75%	32,58%				
		Financeiro	R\$ 432.000,00	R\$ 72.021,62	R\$ 219.239,87	R\$ 140.738,51				

A OBRA PASSOU POR IMPREVISTOS COMO O PERÍODO CHUVOSO E COM A FUNDAÇÃO.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA: MUNICIPAL DE PONTE NOVA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: TÚLIO MÁRCIO</b>				<b>DATA DE INÍCIO: 23/08/2021</b>			
<b>OBRA: PISTA DE CAMINHADA NA AV. JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA</b>		<b>LOCAL: AV. JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</b>				<b>PREVISÃO DE TÉRMINO ATUALIZADO: 21/02/2022</b>			
<b>CRONOGRAMA ATUALIZADO</b>									
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	2,04% R\$ 4.971,08	92,00% R\$ 4.573,39	6,50% R\$ 323,12	1,50% R\$ 74,57			
2	PREPARAÇÃO DE TERRENO E DEMOLIÇÕES	Físico % Financeiro	6,97% R\$ 21.909,19	88,00% R\$ 19.280,08	12,00% R\$ 2.629,10				
3	PISTA DE CAMINHADA	Físico % Financeiro	90,58% R\$ 233.072,20	28,00% R\$ 65.260,22	59,00% R\$ 137.512,60	13,00% R\$ 30.299,39	30,00% R\$ 69.921,66	50,00% R\$ 116.536,10	20,00% R\$ 46.614,44
4	SERVIÇOS FINAIS	Físico % Financeiro	0,41% R\$ 47,54			100,00% R\$ 47,54			100,00% R\$ 47,54
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>TOTAL</b>		Físico % Financeiro	100,00% R\$ 240.000,00	34,27% R\$ 89.113,69	54,02% R\$ 140.464,82	11,70% R\$ 30.421,49	26,89% R\$ 69.921,66		

A obra passou por imprevistos como a dificuldade de abastecimento e o período chuvoso que interfere diretamente no cronograma. Além disso, os meios-fios que foram fornecidos não correspondiam ao solicitado em planilha, sendo providenciado a troca. Outro fator que influenciou no cronograma foram os tambores para abastecimento que em algumas ocasiões foram furados ou estavam com entulho e lixo dentro, motivados por vandalismo.

Considerando que um dia de chuva em alguns casos afetam o cronograma da obra em vários dias corridos, o prazo atual poderá sofrer alterações futuras.



**PREFEITURA DE  
PONTE NOVA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL**

**DATA DE INÍCIO: 12/07/2021**

**LOCAL: R. MANOEL ALVES DA SILVA - JOÃO ALVES DE OLIVEIRA**

**PREVISÃO DE TÉRMINO ATUALIZADO: 15/04/2022**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: MIBENE/TÚLIO**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	0,13% R\$ 647,95	100,00% R\$ 647,95					
2	DRENAGEM PLUVIAL	Físico % Financeiro	99,87% R\$ 479.352,03	50,00% R\$ 239.676,02	50,00% R\$ 239.676,02				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>TOTAL</b>		Físico % Financeiro	100,00% R\$ 479.999,98	50,07% R\$ 240.323,97	49,93% R\$ 239.676,02				

Obra apresentou diversos imprevistos como a interferência de redes de água e esgoto, além de cabos de fibra óticas encontradas após escavação. Dessa forma, somado ao período chuvoso que se inicia, o prazo foi diretamente afetado.

A obra será paralisada durante o período chuvoso e retornará após a estagem para garantir o menor transtorno possível aos moradores.

A previsão de término poderá sofrer novas alterações dependendo das imprevisibilidades encontradas durante a execução dos serviços.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
SERVIÇO: Reforma do Centro Municipal de Esportes e Lazer - 3ª Etapa		LOCAL: Rua João Piranga, Triângulo, Ponte Nova - MG			PRAZO DA OBRA: 31/01/2022	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	EXECUTADO	A EXECUTAR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,97%	85,00%	15,00%	
		Financeiro	R\$ 9.252,30	R\$ 7.864,46	R\$ 1.387,85	
2	REFORMA DOS VESTIÁRIOS	Físico %	20,69%	96,00%	4,00%	
		Financeiro	R\$ 97.038,97	R\$ 93.157,41	R\$ 3.881,56	
3	CALÇAMENTO ENTRADA	Físico %	7,90%	73,00%	27,00%	
		Financeiro	R\$ 37.045,23	R\$ 27.043,02	R\$ 10.002,21	
4	ALAMBRADO ATRÁS DO GOL	Físico %	15,23%	32,00%	68,00%	
		Financeiro	R\$ 71.417,65	R\$ 22.853,65	R\$ 48.564,00	
5	PISO/CALÇAMENTO/PLANTIO DE GRAMA NAS DEMAIS ÁREAS	Físico %	7,05%	33,00%	67,00%	
		Financeiro	R\$ 33.064,96	R\$ 10.911,44	R\$ 22.153,52	
6	REFORMA DO PRÉDIO DO BAR	Físico %	16,45%	82,00%	12,00%	
		Financeiro	R\$ 77.160,99	R\$ 63.272,01	R\$ 9.259,32	
7	MURO EXTERNO	Físico %	8,51%	99,00%	1,00%	
		Financeiro	R\$ 39.909,15	R\$ 39.510,06	R\$ 399,09	
8	CERCAMENTO DO ACESSO ÀS PICINAS E FUNDOS	Físico %	10,88%	38,00%	62,00%	
		Financeiro	R\$ 51.015,92	R\$ 19.386,05	R\$ 31.629,87	
9	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	Físico %	4,74%	51,00%	49,00%	
		Financeiro	R\$ 22.336,85	R\$ 11.391,79	R\$ 10.945,06	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	4,44%	16,00%	84,00%	
		Financeiro	R\$ 20.820,76	R\$ 3.331,32	R\$ 17.489,44	
11	DRENAGEM DO TALUDE	Físico %	2,12%	38,00%	6,00%	
		Financeiro	R\$ 9.937,22	R\$ 3.776,14	R\$ 596,23	
TOTAL		Físico %	100,00%	64,50%	33,33%	
		Financeiro	R\$ 469.000,00	R\$ 302.497,35	R\$ 156.308,15	

Marina Rosa Godoi  
Eng Civil - CREA 227049/D



**Ponte Nova**  
Prefeitura Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

CRONOGRAMA DE ANDAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		VALOR DA OBRA: R\$ 254.219,38				DATA: 15/04/2020			
OBRA: Reforma e Ampliação E. M. Luiz Martins Soares Sabrinho		LOCAL: R. Waldemar Gomes da Silva, nº143 - Bairro Triângulo Novo - Ponte Nova/MG				PRAZO DA OBRA: 03 meses			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,49%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.271,19	R\$ 1.271,19					
2	DEMOLIÇÃO	Físico %	0,51%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.314,54	R\$ 1.314,54					
3	TRANSPORTE	Físico %	0,28%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 715,47	R\$ 715,47					
4	ESTRUTURA (RAMPA E ANEXOS)	Físico %	27,49%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 70.434,80	R\$ 35.217,40	R\$ 35.217,40				
5	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	Físico %	4,03%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 15.443,07	R\$ 15.443,07					
6	PISO	Físico %	13,98%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 35.817,37	R\$ 35.817,37					
7	REVESTIMENTO	Físico %	10,95%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 28.043,28	R\$ 28.043,28					
8	ESQUADRIAS	Físico %	5,41%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 14.386,12	R\$ 14.386,12					
9	PINTURA	Físico %	5,88%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 15.055,04	R\$ 15.055,04					
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,28%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 13.537,50	R\$ 13.537,50					
11	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	Físico %	2,54%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 6.517,34	R\$ 6.517,34					
12	METAIS	Físico %	0,04%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 149,28	R\$ 149,28					
13	PONTOS DE HIDRÁULICA	Físico %	0,27%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 679,88	R\$ 679,88					
14	COBERTURA	Físico %	5,45%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 14.467,70	R\$ 14.467,70					
15	DIVERSOS	Físico %	14,79%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 37.886,80	R\$ 37.886,80					
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>14,39%</b>	<b>15,23%</b>	<b>58,40%</b>				
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 254.219,38</b>	<b>R\$ 37.018,41</b>	<b>R\$ 149.641,74</b>	<b>R\$ 47.558,81</b>			

**Observações:** Fiscal Responsável: Libânia Brito de Oliveira Carmo - Eng. Civil - CREA: 238.339/D  
 Data de início: 10/09/2020 Previsão de término: Fevereiro de 2022  
 Situação: Obra em fase de acabamento.  
 Empresa Notificada  
**Valor do contrato:** R\$ 213.900,00  
**Aditivo 01:** R\$ 95.457,48  
**Supressão:** R\$ 17.345,49

**CRONOGRAMA DE ANDAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		VALOR DA OBRA: R\$ 777.549,16		DATA: 17/01/2020					
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ALVES COSTA		LOCAL: AV. GETÚLIO VARGAS, 818 - BAIRRO TRIÂNGULO		PRAZO DA OBRA: 03 meses					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,68%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 5.324,09	R\$ 5.324,09					
2	DEMOLIÇÃO	Físico %	0,61%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 3.944,95	R\$ 3.944,95					
3	TRANSPORTE	Físico %	0,65%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 5.035,19	R\$ 5.035,19					
4	FUNDAÇÃO	Físico %	2,28%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 17.725,39	R\$ 17.725,39					
5	ESTRUTURA	Físico %	24,04%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 186.886,03	R\$ 93.443,02	R\$ 93.443,02				
6	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	Físico %	2,65%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 20.577,98	R\$ 20.577,98					
7	CALÇADA	Físico %	1,99%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 15.474,68			R\$ 15.474,68			
8	RAMPA ACESSÍVEL/ESCALADA	Físico %	3,90%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 30.344,09		R\$ 30.344,09				
9	COBERTURA	Físico %	8,12%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 63.158,80			R\$ 63.158,80			
10	REVESTIMENTO	Físico %	0,46%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 3.615,21		R\$ 1.807,60	R\$ 1.807,60			
11	PISOS	Físico %	27,48%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 213.707,59		R\$ 213.707,59				
12	PINTURA	Físico %	10,10%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 78.551,79			R\$ 78.551,79			
13	ESQUADRIAS	Físico %	3,92%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 30.516,85		R\$ 15.258,42	R\$ 15.258,42			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,82%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 21.940,88		R\$ 21.940,88				
15	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	Físico %	0,91%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 7.052,36			R\$ 7.052,36			



**Ponte Nova**  
Prefeitura Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**CRONOGRAMA DE ANDAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		VALOR DA OBRA: R\$ 254.219,38				DATA: 16/06/2020			
OBRA: Reforma e Ampliação E. M. Luz Martins Soares Sobrinho		LOCAL: R. Waldemar Gomes da Silva, nº143 - Bairro Triângulo Novo - Ponte Nova/MG				PRAZO DA OBRA: 03 meses			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,69%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.771,19	R\$ 1.771,19					
2	DEMOIÇÃO	Físico %	0,81%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.314,54	R\$ 1.314,54					
3	TRANSPORTE	Físico %	0,38%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 715,47	R\$ 715,47					
4	ESTRUTURA (RAMPA E ANEXOS)	Físico %	27,49%	80,00%	80,00%				
		Financeiro	R\$ 70.434,80	R\$ 35.217,40	R\$ 35.217,40				
5	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	Físico %	6,08%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 15.443,07		R\$ 15.443,07				
6	PISO	Físico %	13,96%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 35.817,37		R\$ 35.817,37				
7	REVESTIMENTO	Físico %	10,88%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 28.043,28		R\$ 28.043,28				
8	ESQUADRIAS	Físico %	6,83%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 14.386,12		R\$ 14.386,12				
9	PINTURA	Físico %	6,68%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 15.055,04			R\$ 15.055,04			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	8,28%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 13.537,50		R\$ 13.537,50				
11	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	Físico %	2,84%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 6.517,34		R\$ 6.517,34				
12	METAIS	Físico %	0,04%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 149,28			R\$ 149,28			
13	PONTOS DE HIDRÁULICA	Físico %	0,27%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 679,88		R\$ 679,88				
14	COBERTURA	Físico %	6,68%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 14.467,70			R\$ 14.467,70			
15	DIVERSOS	Físico %	14,79%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 37.886,80			R\$ 37.886,80			
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>94,39%</b>	<b>15,23%</b>	<b>58,40%</b>	<b>24,37%</b>			
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 254.219,38</b>	<b>R\$ 39.018,61</b>	<b>R\$ 147.641,94</b>	<b>R\$ 67.558,81</b>			

Libânia Brito de Oliveira Carmo  
Eng. Civil CREA MG 238339/D

Observações:

16	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	Físico %	0,05%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 418,30			R\$ 418,30		
17	PONTOS DE HIDRÁULICA	Físico %	0,16%		100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.269,06		R\$ 1.269,06			
18	DIVERSOS	Físico %	9,26%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 72.005,93			R\$ 72.005,93		
TOTAL		Físico %	R\$ 1,00	16,14%	51,23%	32,63%		
		Financeiro	R\$ 777.549,16	R\$ 125.472,63	R\$ 398.348,64	R\$ 253.727,88		

**Observações:** Fiscal Responsável: Libânia Brito da Oliveira Carmo - Eng. CIVIL - CREA: 238.339/D  
 Data de início : 06/02/2020 Previsão de término: Maio de 2022  
 Situação: Obra em fase de acabamento. Aguardando 4º aditivo.  
 Empresa Notificada  
**Valor do contrato:** R\$ 613.900,00  
**Aditivo 01:** R\$ 15.394,90  
**Aditivo 02:** R\$ 39.785,71  
**Aditivo 03:** R\$ 49.010,68  
**Supressão:** R\$ 2.779,39



**Ponte Nova**  
Prefeitura Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CRONOGRAMA DE ANDAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA</b>		<b>VALOR DA OBRA: R\$ 99.500,00</b>							
<b>OBRA: Cercamento do Aeroporto de Ponte Nova</b>		<b>LOCAL: Final da Avenida Afonso Vasconcelos - Ponte Nova/MG</b>				<b>PRAZO DA OBRA: 01 MÊS</b>			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CERCAMENTO	Físico %	100,00%	100,00%					
	<b>TOTAL</b>	Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 99.500,00	R\$ 99.500,00					

**Observações:** Fiscal Responsável: Libânio Brito de Oliveira Carmo - Eng. Civil CREA:238.339/D  
 Data de início : 09/11/2020      Previsão de término: Janeiro de 2022  
 Situação: Finalizando a instalação dos alambrados  
 Empresa Notificada

**LEGENDA:**

	Serviços concluídos
	Serviços em execução
	Serviços a executar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**CRONOGRAMA DE ANDAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		VALOR DA OBRA:		PRAZO DA OBRA: 03 meses					
OBRA: Reforma e ampliação Escola Municipal Dr. Luiz Augusto		R\$ 283.827,79							
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
8	COBERTURA	Físico % 17,13%			100,00%				
		Financeiro	R\$ 48.429,90		R\$ 48.429,90				
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % 4,64%			100,00%				
		Financeiro	R\$ 12.592,85		R\$ 12.592,85				
18	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	Físico % 0,46%				100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.126,90			R\$ 1.126,90			
17	DIVERSOS	Físico % 3,89%				100,00%			
		Financeiro	R\$ 9.045,23			R\$ 9.045,23			
		Físico %	100,00%	34,49%	61,61%	79,94%			
		Financeiro	R\$ 283.827,79	R\$ 78.886,73	R\$ 161.464,35	R\$ 24.714,51			
<p>Observações: Rical Responsável: Ildônia Brito de Oliveira Camo - Eng. CIVIL - CREA: 238.335/D            Data de início: 28/09/2020            Situação: Obra em fase de acabamento. Aguardando oclivo.            Empresa Notificada: [REDACTED]</p> <p>LEGENDA:  <input checked="" type="checkbox"/> Serviços concluídos  <input type="checkbox"/> Serviços em execução  <input type="checkbox"/> Serviços a executar</p> <p>Aditivos: R\$ 15.394,00            Supressão: R\$ 3.848,80</p>									
